Базовые допущения графика

Критерий *(нажать на плюс, чтобы развернуть скрытые строки)*	*Коэф-т*
Единица измерения деталей - кв.м. поверхности	
Единица измерения утеплителя - кв.м. фасада	
Единица измерения подсистемы - *кг*	
Фронты передаются заказчиком по 2 фасада подряд с установкой лесов и верт.транспорта	
Монтаж ведется поэтажно снизу вверх	
Монтажные звенья расставлены равномерно на весь фасад	
Монтаж ведется в 2 смены по 10 часов (+2 ч обеды + пересменка)	20
Производство не работает по воскресеньям и общегосударственным праздникам	
Монтаж ведется без выходных за искл. 4 дней в январе и 4 дней в мае	
Мощность производства: 750 кв.м. деталей в месяц (2 установки)	61 кв.м изделий в сут
Объем деталей на весь проект: 7300 кв.м.	7300 кв.м
Объем подсистемы на весь проект:	70000 кг
Коэф-т пересчета деталей в подсистему	9,6
Площадь фасада реальная	2500 кв.м
Срок монтажа: 10 месяцев (каждые 2 месяца по 2 фасада)	
Коэф-т пересчета деталей в утеплитель	0,34
Суточный темп на монтаже деталей:	25 кв.м изделий в сут
Суточный темп на пр-ве подсистемы	292 кг/сут
Суточный темп на монтаже подсистемы:	241 кг изделий в сут
Норматив выработки на монтаже деталей:	0,50 кв.м изд/смену на 1 чел

График производства работ на весь объект

№ п/п	Наименование захваток и работ	Ед.изм	Объем по проекту	Начало работ	Окончание работ	Срок, раб.дней	Сут.темп
I	***Фасад Б-Ж***						
I.1	*1 этаж*						
I.1.1	Изготовление деталей	кв.м	205	1 окт 16	6 окт 16	4	61
I.1.2	Изготовление подсистемы	кг	1965	1 окт 16	9 окт 16	7	292
I.1.3	Монтаж подсистемы	кг	1965	1 ноя 16	12 ноя 16	9	241
I.1.4	Монтаж утеплителя	кв.м	70	2 ноя 16	13 ноя 16	9	8,6
I.1.5	Монтаж деталей	кв.м	205	3 ноя 16	14 ноя 16	9	25
I.2	*2 этаж*						
I.2.1	Изготовление деталей	кв.м	61	7 окт 16	10 окт 16	2	61
I.2.2	Изготовление подсистемы	кг	587	7 окт 16	11 окт 16	3	292
I.2.3	Монтаж подсистемы	кг	587	15 ноя 16	19 ноя 16	3	241
I.2.4	Монтаж утеплителя	кв.м	21	16 ноя 16	20 ноя 16	3	8,6
I.2.5	Монтаж деталей	кв.м	61	17 ноя 16	21 ноя 16	3	25
I.3	*3 этаж*						
I.3.1	Изготовление деталей	кв.м	328	11 окт 16	18 окт 16	6	61
I.3.2	Изготовление подсистемы	кг	3144	11 окт 16	24 окт 16	11	292
I.3.3	Монтаж подсистемы	кг	3144	22 ноя 16	8 дек 16	14	241
I.3.4	Монтаж утеплителя	кв.м	112	23 ноя 16	9 дек 16	14	8,6
I.3.5	Монтаж деталей	кв.м	328	24 ноя 16	10 дек 16	14	25
I.4	*4 этаж*						
I.4.1	Изготовление деталей	кв.м	61	19 окт 16	22 окт 16	2	61
I.4.2	Изготовление подсистемы	кг	587	19 окт 16	23 окт 16	3	292
I.4.3	Монтаж подсистемы	кг	587	11 дек 16	15 дек 16	3	241
I.4.4	Монтаж утеплителя	кв.м	21	12 дек 16	16 дек 16	3	8,6
I.4.5	Монтаж деталей	кв.м	61	13 дек 16	17 дек 16	3	25
I.5	*5 этаж*						
I.5.1	Изготовление деталей	кв.м	147	23 окт 16	27 окт 16	3	61
I.5.2	Изготовление подсистемы	кг	1408	23 окт 16	29 окт 16	5	292
I.5.3	Монтаж подсистемы	кг	1408	18 дек 16	25 дек 16	6	241
I.5.4	Монтаж утеплителя	кв.м	50	19 дек 16	26 дек 16	6	8,6
I.5.5	Монтаж деталей	кв.м	147	20 дек 16	27 дек 16	6	25
I.П	*Парапет*						
I.П.1	Изготовление деталей	кв.м	285	28 окт 16	3 ноя 16	5	61
I.П.2	Изготовление подсистемы	кг	2730	28 окт 16	9 ноя 16	10	292
I.П.3	Монтаж подсистемы	кг	2730	15 дек 16	29 дек 16	12	241
I.П.4	Монтаж утеплителя	кв.м	97	16 дек 16	30 дек 16	12	8,6
I.П.5	Монтаж деталей	кв.м	285	17 дек 16	31 дек 16	12	25
II	***Фасад 12-3***						
II.1	*1 этаж*						
II.1.1	Изготовление деталей	кв.м	263	1 ноя 16	7 ноя 16	5	61
II.1.2	Изготовление подсистемы	кг	2520	1 ноя 16	12 ноя 16	9	292
II.1.3	Монтаж подсистемы	кг	2520	1 ноя 16	14 ноя 16	11	241
II.1.4	Монтаж утеплителя	кв.м	90	2 ноя 16	15 ноя 16	11	8,6
II.1.5	Монтаж деталей	кв.м	263	3 ноя 16	16 ноя 16	11	25
II.2	*2 этаж*						
II.2.1	Изготовление деталей	кв.м	61	8 ноя 16	10 ноя 16	1	61
II.2.2	Изготовление подсистемы	кг	581	8 ноя 16	11 ноя 16	2	292
II.2.3	Монтаж подсистемы	кг	581	17 ноя 16	21 ноя 16	3	241
II.2.4	Монтаж утеплителя	кв.м	21	18 ноя 16	22 ноя 16	3	8,6
II.2.5	Монтаж деталей	кв.м	61	19 ноя 16	23 ноя 16	3	25
II.3	*3 этаж*						
II.3.1	Изготовление деталей	кв.м	397	11 ноя 16	19 ноя 16	7	61
II.3.2	Изготовление подсистемы	кг	3803	11 ноя 16	27 ноя 16	14	292
II.3.3	Монтаж подсистемы	кг	3803	24 ноя 16	13 дек 16	16	241
II.3.4	Монтаж утеплителя	кв.м	136	25 ноя 16	14 дек 16	16	8,6
II.3.5	Монтаж деталей	кв.м	397	26 ноя 16	15 дек 16	16	25
II.4	*4 этаж*						
II.4.1	Изготовление деталей	кв.м	52	20 ноя 16	22 ноя 16	1	61
II.4.2	Изготовление подсистемы	кг	495	20 ноя 16	23 ноя 16	2	292
II.4.3	Монтаж подсистемы	кг	495	16 дек 16	20 дек 16	3	241
II.4.4	Монтаж утеплителя	кв.м	18	17 дек 16	21 дек 16	3	8,6
II.4.5	Монтаж деталей	кв.м	52	18 дек 16	22 дек 16	3	25
II.5	*5 этаж*						
II.5.1	Изготовление деталей	кв.м	195	23 ноя 16	28 ноя 16	4	61
II.5.2	Изготовление подсистемы	кг	1872	23 ноя 16	1 дек 16	7	292
II.5.3	Монтаж подсистемы	кг	1872	20 дек 16	30 дек 16	8	241
II.5.4	Монтаж утеплителя	кв.м	67	21 дек 16	31 дек 16	8	8,6
II.5.5	Монтаж деталей	кв.м	195	21 дек 16	31 дек 16	8	25
II.П	*Парапет*						
II.П.1	Изготовление деталей	кв.м	521	29 ноя 16	10 дек 16	9	61
II.П.2	Изготовление подсистемы	кг	4992	29 ноя 16	20 дек 16	18	292
II.П.3	Монтаж подсистемы	кг	4992	5 янв 17	29 янв 17	21	241
II.П.4	Монтаж утеплителя	кв.м	178	6 янв 17	30 янв 17	21	8,6
II.П.5	Монтаж деталей	кв.м	521	7 янв 17	31 янв 17	21	25
III	***Фасад Ж-Б***						
III.1	*1 этаж*						
III.1.1	Изготовление деталей	кв.м	227	11 дек 16	16 дек 16	4	61
III.1.2	Изготовление подсистемы	кг	2179	11 дек 16	21 дек 16	8	292
III.1.3	Монтаж подсистемы	кг	2179	5 янв 17	17 янв 17	10	241
III.1.4	Монтаж утеплителя	кв.м	78	6 янв 17	18 янв 17	10	8,6
III.1.5	Монтаж деталей	кв.м	227	7 янв 17	19 янв 17	10	25
III.2	*2 этаж*						
III.2.1	Изготовление деталей	кв.м	37	17 дек 16	19 дек 16	1	61
III.2.2	Изготовление подсистемы	кг	358	17 дек 16	20 дек 16	2	292
III.2.3	Монтаж подсистемы	кг	358	20 янв 17	23 янв 17	2	241
III.2.4	Монтаж утеплителя	кв.м	13	21 янв 17	24 янв 17	2	8,6
III.2.5	Монтаж деталей	кв.м	37	22 янв 17	25 янв 17	2	25
III.3	*3 этаж*						
III.3.1	Изготовление деталей	кв.м	308	20 дек 16	27 дек 16	6	61
III.3.2	Изготовление подсистемы	кг	2952	20 дек 16	12 янв 17	11	292
III.3.3	Монтаж подсистемы	кг	2952	26 янв 17	10 фев 17	13	241
III.3.4	Монтаж утеплителя	кв.м	105	27 янв 17	11 фев 17	13	8,6
III.3.5	Монтаж деталей	кв.м	308	28 янв 17	12 фев 17	13	25
III.4	*4 этаж*						
III.4.1	Изготовление деталей	кв.м	37	28 дек 16	30 дек 16	1	61
III.4.2	Изготовление подсистемы	кг	358	28 дек 16	31 дек 16	2	292
III.4.3	Монтаж подсистемы	кг	358	13 фев 17	16 фев 17	2	241
III.4.4	Монтаж утеплителя	кв.м	13	14 фев 17	17 фев 17	2	8,6
III.4.5	Монтаж деталей	кв.м	37	15 фев 17	18 фев 17	2	25
III.5	*5 этаж*						
III.5.1	Изготовление деталей	кв.м	129	11 янв 17	15 янв 17	3	61
III.5.2	Изготовление подсистемы	кг	1234	12 янв 17	18 янв 17	5	292
III.5.3	Монтаж подсистемы	кг	1234	19 фев 17	26 фев 17	6	241
III.5.4	Монтаж утеплителя	кв.м	44	20 фев 17	27 фев 17	6	8,6
III.5.5	Монтаж деталей	кв.м	129	21 фев 17	28 фев 17	6	25
III.П	*Парапет*						
III.П.1	Изготовление деталей	кв.м	349	16 янв 17	23 янв 17	6	61
III.П.2	Изготовление подсистемы	кг	3343	16 янв 17	30 янв 17	12	292
III.П.3	Монтаж подсистемы	кг	3343	1 мар 17	17 мар 17	14	241
III.П.4	Монтаж утеплителя	кв.м	119	2 мар 17	18 мар 17	14	8,6
III.П.5	Монтаж деталей	кв.м	349	3 мар 17	19 мар 17	14	25
IV	***Фасад 3-5***						
IV.1	*1 этаж*						
IV.1.1	Изготовление деталей	кв.м	98	24 янв 17	27 янв 17	2	61
IV.1.2	Изготовление подсистемы	кг	941	24 янв 17	29 янв 17	4	292
IV.1.3	Монтаж подсистемы	кг	941	1 фев 17	6 фев 17	4	241
IV.1.4	Монтаж утеплителя	кв.м	34	2 фев 17	7 фев 17	4	8,6
IV.1.5	Монтаж деталей	кв.м	98	3 фев 17	8 фев 17	4	25
IV.2	*2 этаж*						
IV.2.1	Изготовление деталей	кв.м	12	28 янв 17	30 янв 17	1	61
IV.2.2	Изготовление подсистемы	кг	115	28 янв 17	30 янв 17	1	292
IV.2.3	Монтаж подсистемы	кг	115	9 фев 17	11 фев 17	1	241
IV.2.4	Монтаж утеплителя	кв.м	4	10 фев 17	12 фев 17	1	8,6
IV.2.5	Монтаж деталей	кв.м	12	11 фев 17	13 фев 17	1	25

IV.3	*3 этаж*						
IV.3.1	Изготовление деталей	кв.м	137	31 янв 17	4 фев 17	3	61
IV.3.2	Изготовление подсистемы	кг	1312	31 янв 17	6 фев 17	5	292
IV.3.3	Монтаж подсистемы	кг	1312	9 фев 17	16 фев 17	6	241
IV.3.4	Монтаж утеплителя	кв.м	47	10 фев 17	17 фев 17	6	8,6
IV.3.5	Монтаж деталей	кв.м	137	11 фев 17	18 фев 17	6	25
IV.4	*4 этаж*						
IV.4.1	Изготовление деталей	кв.м	12	5 фев 17	7 фев 17	1	61
IV.4.2	Изготовление подсистемы	кг	115	5 фев 17	7 фев 17	1	292
IV.4.3	Монтаж подсистемы	кг	115	19 фев 17	21 фев 17	1	241
IV.4.4	Монтаж утеплителя	кв.м	4	20 фев 17	22 фев 17	1	8,6
IV.4.5	Монтаж деталей	кв.м	12	21 фев 17	23 фев 17	1	25
IV.5	*5 этаж*						
IV.5.1	Изготовление деталей	кв.м	68	8 фев 17	11 фев 17	2	61
IV.5.2	Изготовление подсистемы	кг	650	8 фев 17	12 фев 17	3	292
IV.5.3	Монтаж подсистемы	кг	650	24 фев 17	28 фев 17	3	241
IV.5.4	Монтаж утеплителя	кв.м	23	25 фев 17	1 мар 17	3	8,6
IV.5.5	Монтаж деталей	кв.м	68	26 фев 17	2 мар 17	3	25
IV.П	*Парапет*						
IV.П.1	Изготовление деталей	кв.м	135	12 фев 17	16 фев 17	3	61
IV.П.2	Изготовление подсистемы	кг	1298	13 фев 17	19 фев 17	5	292
IV.П.3	Монтаж подсистемы	кг	1298	3 мар 17	10 мар 17	6	241
IV.П.4	Монтаж утеплителя	кв.м	46	4 мар 17	11 мар 17	6	8,6
IV.П.5	Монтаж деталей	кв.м	135	5 мар 17	12 мар 17	6	25
V	***Фасад Б-Д***						
V.1	*1 этаж*						
V.1.1	Изготовление деталей	кв.м	61	17 фев 17	19 фев 17	1	61
V.1.2	Изготовление подсистемы	кг	582	17 фев 17	20 фев 17	2	292
V.1.3	Монтаж подсистемы	кг	582	20 мар 17	24 мар 17	3	241
V.1.4	Монтаж утеплителя	кв.м	21	21 мар 17	25 мар 17	3	8,6
V.1.5	Монтаж деталей	кв.м	61	22 мар 17	26 мар 17	3	25
V.2	*2 этаж*						
V.2.1	Изготовление деталей	кв.м	117	20 фев 17	23 фев 17	2	61
V.2.2	Изготовление подсистемы	кг	1123	20 фев 17	25 фев 17	4	292
V.2.3	Монтаж подсистемы	кг	1123	27 мар 17	2 апр 17	5	241
V.2.4	Монтаж утеплителя	кв.м	40	28 мар 17	3 апр 17	5	8,6
V.2.5	Монтаж деталей	кв.м	117	29 мар 17	4 апр 17	5	25
V.3	*3 этаж*						
V.3.1	Изготовление деталей	кв.м	139	24 фев 17	28 фев 17	3	61
V.3.2	Изготовление подсистемы	кг	1331	24 фев 17	2 мар 17	5	292
V.3.3	Монтаж подсистемы	кг	1331	5 апр 17	12 апр 17	6	241
V.3.4	Монтаж утеплителя	кв.м	48	6 апр 17	13 апр 17	6	8,6
V.3.5	Монтаж деталей	кв.м	139	7 апр 17	14 апр 17	6	25
V.4	*4 этаж*						
V.4.1	Изготовление деталей	кв.м	82	1 мар 17	4 мар 17	2	61
V.4.2	Изготовление подсистемы	кг	783	1 мар 17	5 мар 17	3	292
V.4.3	Монтаж подсистемы	кг	783	15 апр 17	20 апр 17	4	241
V.4.4	Монтаж утеплителя	кв.м	28	16 апр 17	21 апр 17	4	8,6
V.4.5	Монтаж деталей	кв.м	82	17 апр 17	22 апр 17	4	25
V.5	*5 этаж*						
V.5.1	Изготовление деталей	кв.м	52	5 мар 17	7 мар 17	1	61
V.5.2	Изготовление подсистемы	кг	496	5 мар 17	8 мар 17	2	292
V.5.3	Монтаж подсистемы	кг	496	23 апр 17	27 апр 17	3	241
V.5.4	Монтаж утеплителя	кв.м	18	24 апр 17	28 апр 17	3	8,6
V.5.5	Монтаж деталей	кв.м	52	25 апр 17	29 апр 17	3	25
V.П	*Парапет*						
V.П.1	Изготовление деталей	кв.м	187	8 мар 17	13 мар 17	4	61
V.П.2	Изготовление подсистемы	кг	1794	8 мар 17	16 мар 17	7	292
V.П.3	Монтаж подсистемы	кг	1794	30 апр 17	14 май 17	8	241
V.П.4	Монтаж утеплителя	кв.м	64	5 май 17	15 май 17	8	8,6
V.П.5	Монтаж деталей	кв.м	187	6 май 17	16 май 17	8	25
VI	***Фасад 5-10***						
VI.1	*1 этаж*						
VI.1.1	Изготовление деталей	кв.м	327	14 мар 17	21 мар 17	6	61
VI.1.2	Изготовление подсистемы	кг	3140	14 мар 17	27 мар 17	11	292
VI.1.3	Монтаж подсистемы	кг	3140	13 мар 17	29 мар 17	14	241
VI.1.4	Монтаж утеплителя	кв.м	112	14 мар 17	30 мар 17	14	8,6
VI.1.5	Монтаж деталей	кв.м	327	15 мар 17	31 мар 17	14	25
VI.2	*2 этаж*						
VI.2.1	Изготовление деталей	кв.м	112	22 мар 17	25 мар 17	2	61
VI.2.2	Изготовление подсистемы	кг	1078	23 мар 17	28 мар 17	4	292
VI.2.3	Монтаж подсистемы	кг	1078	1 апр 17	7 апр 17	5	241
VI.2.4	Монтаж утеплителя	кв.м	38	2 апр 17	8 апр 17	5	8,6
VI.2.5	Монтаж деталей	кв.м	112	3 апр 17	9 апр 17	5	25
VI.3	*3 этаж*						
VI.3.1	Изготовление деталей	кв.м	381	26 мар 17	3 апр 17	7	61
VI.3.2	Изготовление подсистемы	кг	3652	26 мар 17	10 апр 17	13	292
VI.3.3	Монтаж подсистемы	кг	3652	10 апр 17	29 апр 17	16	241
VI.3.4	Монтаж утеплителя	кв.м	130	11 апр 17	30 апр 17	16	8,6
VI.3.5	Монтаж деталей	кв.м	381	12 апр 17	5 май 17	16	25
VI.4	*4 этаж*						
VI.4.1	Изготовление деталей	кв.м	117	4 апр 17	7 апр 17	2	61
VI.4.2	Изготовление подсистемы	кг	1126	4 апр 17	9 апр 17	4	292
VI.4.3	Монтаж подсистемы	кг	1126	6 май 17	12 май 17	5	241
VI.4.4	Монтаж утеплителя	кв.м	40	7 май 17	13 май 17	5	8,6
VI.4.5	Монтаж деталей	кв.м	117	8 май 17	14 май 17	5	25
VI.5	*5 этаж*						
VI.5.1	Изготовление деталей	кв.м	163	8 апр 17	12 апр 17	3	61
VI.5.2	Изготовление подсистемы	кг	1563	8 апр 17	15 апр 17	6	292
VI.5.3	Монтаж подсистемы	кг	1563	15 май 17	23 май 17	7	241
VI.5.4	Монтаж утеплителя	кв.м	56	16 май 17	24 май 17	7	8,6
VI.5.5	Монтаж деталей	кв.м	163	17 май 17	25 май 17	7	25
VI.П	*Парапет*						
VI.П.1	Изготовление деталей	кв.м	267	13 апр 17	19 апр 17	5	61
VI.П.2	Изготовление подсистемы	кг	2560	13 апр 17	24 апр 17	9	292
VI.П.3	Монтаж подсистемы	кг	2560	26 май 17	8 июн 17	11	241
VI.П.4	Монтаж утеплителя	кв.м	91	27 май 17	9 июн 17	11	8,6
VI.П.5	Монтаж деталей	кв.м	267	28 май 17	10 июн 17	11	25
VI.К	*Кровля*						
VI.К.1	Изготовление деталей	кв.м	23	20 апр 17	22 апр 17	1	61
VI.К.2	Изготовление подсистемы	кг	218	20 апр 17	22 апр 17	1	292
VI.К.3	Монтаж подсистемы	кг	218	11 июн 17	13 июн 17	1	241
VI.К.4	Монтаж утеплителя	кв.м	8	12 июн 17	14 июн 17	1	8,6
VI.К.5	Монтаж деталей	кв.м	23	13 июн 17	15 июн 17	1	25
VII	***Фасад Д-Б***						
VII.1	*1 этаж*						
VII.1.1	Изготовление деталей	кв.м	61	23 апр 17	25 апр 17	1	61
VII.1.2	Изготовление подсистемы	кг	582	23 апр 17	26 апр 17	2	292
VII.1.3	Монтаж подсистемы	кг	582	17 май 17	21 май 17	3	241
VII.1.4	Монтаж утеплителя	кв.м	21	18 май 17	22 май 17	3	8,6
VII.1.5	Монтаж деталей	кв.м	61	19 май 17	23 май 17	3	25
VII.2	*2 этаж*						
VII.2.1	Изготовление деталей	кв.м	117	26 апр 17	29 апр 17	2	61
VII.2.2	Изготовление подсистемы	кг	1123	26 апр 17	1 май 17	4	292
VII.2.3	Монтаж подсистемы	кг	1123	24 май 17	30 май 17	5	241
VII.2.4	Монтаж утеплителя	кв.м	40	25 май 17	31 май 17	5	8,6
VII.2.5	Монтаж деталей	кв.м	117	26 май 17	1 июн 17	5	25
VII.3	*3 этаж*						
VII.3.1	Изготовление деталей	кв.м	139	30 апр 17	12 май 17	3	61
VII.3.2	Изготовление подсистемы	кг	1331	30 апр 17	14 май 17	5	292
VII.3.3	Монтаж подсистемы	кг	1331	2 июн 17	9 июн 17	6	241
VII.3.4	Монтаж утеплителя	кв.м	48	3 июн 17	10 июн 17	6	8,6
VII.3.5	Монтаж деталей	кв.м	139	4 июн 17	11 июн 17	6	25
VII.4	*4 этаж*						
VII.4.1	Изготовление деталей	кв.м	82	13 май 17	16 май 17	2	61
VII.4.2	Изготовление подсистемы	кг	783	13 май 17	17 май 17	3	292
VII.4.3	Монтаж подсистемы	кг	783	12 июн 17	17 июн 17	4	241
VII.4.4	Монтаж утеплителя	кв.м	28	13 июн 17	18 июн 17	4	8,6
VII.4.5	Монтаж деталей	кв.м	82	14 июн 17	19 июн 17	4	25
VII.5	*5 этаж*						
VII.5.1	Изготовление деталей	кв.м	52	17 май 17	19 май 17	1	61
VII.5.2	Изготовление подсистемы	кг	496	17 май 17	20 май 17	2	292
VII.5.3	Монтаж подсистемы	кг	496	20 июн 17	24 июн 17	3	241
VII.5.4	Монтаж утеплителя	кв.м	18	21 июн 17	25 июн 17	3	8,6
VII.5.5	Монтаж деталей	кв.м	52	22 июн 17	26 июн 17	3	25
VII.П	*Парапет*						
VII.П.1	Изготовление деталей	кв.м	187	20 май 17	25 май 17	4	61
VII.П.2	Изготовление подсистемы	кг	1794	20 май 17	28 май 17	7	292
VII.П.3	Монтаж подсистемы	кг	1794	27 июн 17	7 июл 17	8	241
VII.П.4	Монтаж утеплителя	кв.м	64	28 июн 17	8 июл 17	8	8,6
VII.П.5	Монтаж деталей	кв.м	187	29 июн 17	9 июл 17	8	25
VIII	***Фасад 10-12***						
VIII.1	*1 этаж*						
VIII.1.1	Изготовление деталей	кв.м	98	26 май 17	29 май 17	2	61
VIII.1.2	Изготовление подсистемы	кг	941	26 май 17	31 май 17	4	292
VIII.1.3	Монтаж подсистемы	кг	941	28 июн 17	6 июл 17	8	121
VIII.1.4	Монтаж утеплителя	кв.м	34	27 июн 17	7 июл 17	8	4,3
VIII.1.5	Монтаж деталей	кв.м	98	28 июн 17	8 июл 17	8	13
VIII.2	*2 этаж*						
VIII.2.1	Изготовление деталей	кв.м	12	30 май 17	1 июн 17	1	61

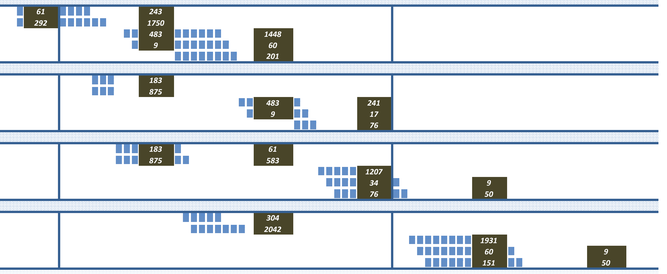

VIII.2.2	Изготовление подсистемы	кг	115	30 май 17	1 июн 17	1	292
VIII.2.3	Монтаж подсистемы	кг	115	9 июл 17	11 июл 17	1	121
VIII.2.4	Монтаж утеплителя	кв.м	4	10 июл 17	12 июл 17	1	4,3
VIII.2.5	Монтаж деталей	кв.м	12	11 июл 17	13 июл 17	1	13
VIII.3	*3 этаж*						
VIII.3.1	Изготовление деталей	кв.м	137	2 июн 17	6 июн 17	3	61
VIII.3.2	Изготовление подсистемы	кг	1312	2 июн 17	8 июн 17	5	292
VIII.3.3	Монтаж подсистемы	кг	1312	14 июл 17	27 июл 17	11	121
VIII.3.4	Монтаж утеплителя	кв.м	47	15 июл 17	28 июл 17	11	4,3
VIII.3.5	Монтаж деталей	кв.м	137	16 июл 17	29 июл 17	11	13
VIII.4	*4 этаж*						
VIII.4.1	Изготовление деталей	кв.м	12	7 июн 17	9 июн 17	1	61
VIII.4.2	Изготовление подсистемы	кг	115	7 июн 17	9 июн 17	1	292
VIII.4.3	Монтаж подсистемы	кг	115	30 июл 17	1 авг 17	1	121
VIII.4.4	Монтаж утеплителя	кв.м	4	31 июл 17	2 авг 17	1	4,3
VIII.4.5	Монтаж деталей	кв.м	12	1 авг 17	3 авг 17	1	13
VIII.5	*5 этаж*						
VIII.5.1	Изготовление деталей	кв.м	68	10 июн 17	13 июн 17	2	61
VIII.5.2	Изготовление подсистемы	кг	650	10 июн 17	14 июн 17	3	292
VIII.5.3	Монтаж подсистемы	кг	650	4 авг 17	11 авг 17	6	121
VIII.5.4	Монтаж утеплителя	кв.м	23	5 авг 17	12 авг 17	6	4,3
VIII.5.5	Монтаж деталей	кв.м	68	6 авг 17	13 авг 17	6	13
VIII.П	*Парапет*						
VIII.П.1	Изготовление деталей	кв.м	135	14 июн 17	18 июн 17	3	61
VIII.П.2	Изготовление подсистемы	кг	1298	14 июн 17	20 июн 17	5	292
VIII.П.3	Монтаж подсистемы	кг	1298	14 авг 17	27 авг 17	11	121
VIII.П.4	Монтаж утеплителя	кв.м	46	15 авг 17	28 авг 17	11	4,3
VIII.П.5	Монтаж деталей	кв.м	135	16 авг 17	29 авг 17	11	13

Производство деталей	кв.м	608	608	669	791	608	608	608	608	608	0	608	669	608	608	487	608	608
Производство подсистемы	кг	3792	3792	5250	6417	4083	5833	3208	7292	4667	2917	4083	5833	3500	4083	2917	4083	3792
Монтаж утеплителя	кв.м	0	0	0	155	138	138	164	172	241	86	155	164	155	138	112	147	138
Монтаж изделий	чел	0	0	0	40	40	40	50	45	71	20	48	43	40	43	44	40	43

окт.16			ноя.16			дек.16			янв.17			фев.17			мар.17	
1-я декада	2-я декада	3-декада	1-я декада	2-я декада	3-я декада	1-я декада	2-я декада	3-декада	1-я декада	2-я декада	3-декада	1-я декада	2-я декада	3-я декада	1-я декада	2-я декада

	II кв-л 2017 г												III кв-л 2017 г		
	апр.17			май.17			июн.17			июл.17			авг.17		
3-декада	1-я декада	2-я декада	3-я декада	1-я декада	2-я декада	3-декада	1-я декада	2-я декада	3-я декада	1-я декада	2-я декада	3-декада	1-я декада	2-я декада	3-декада

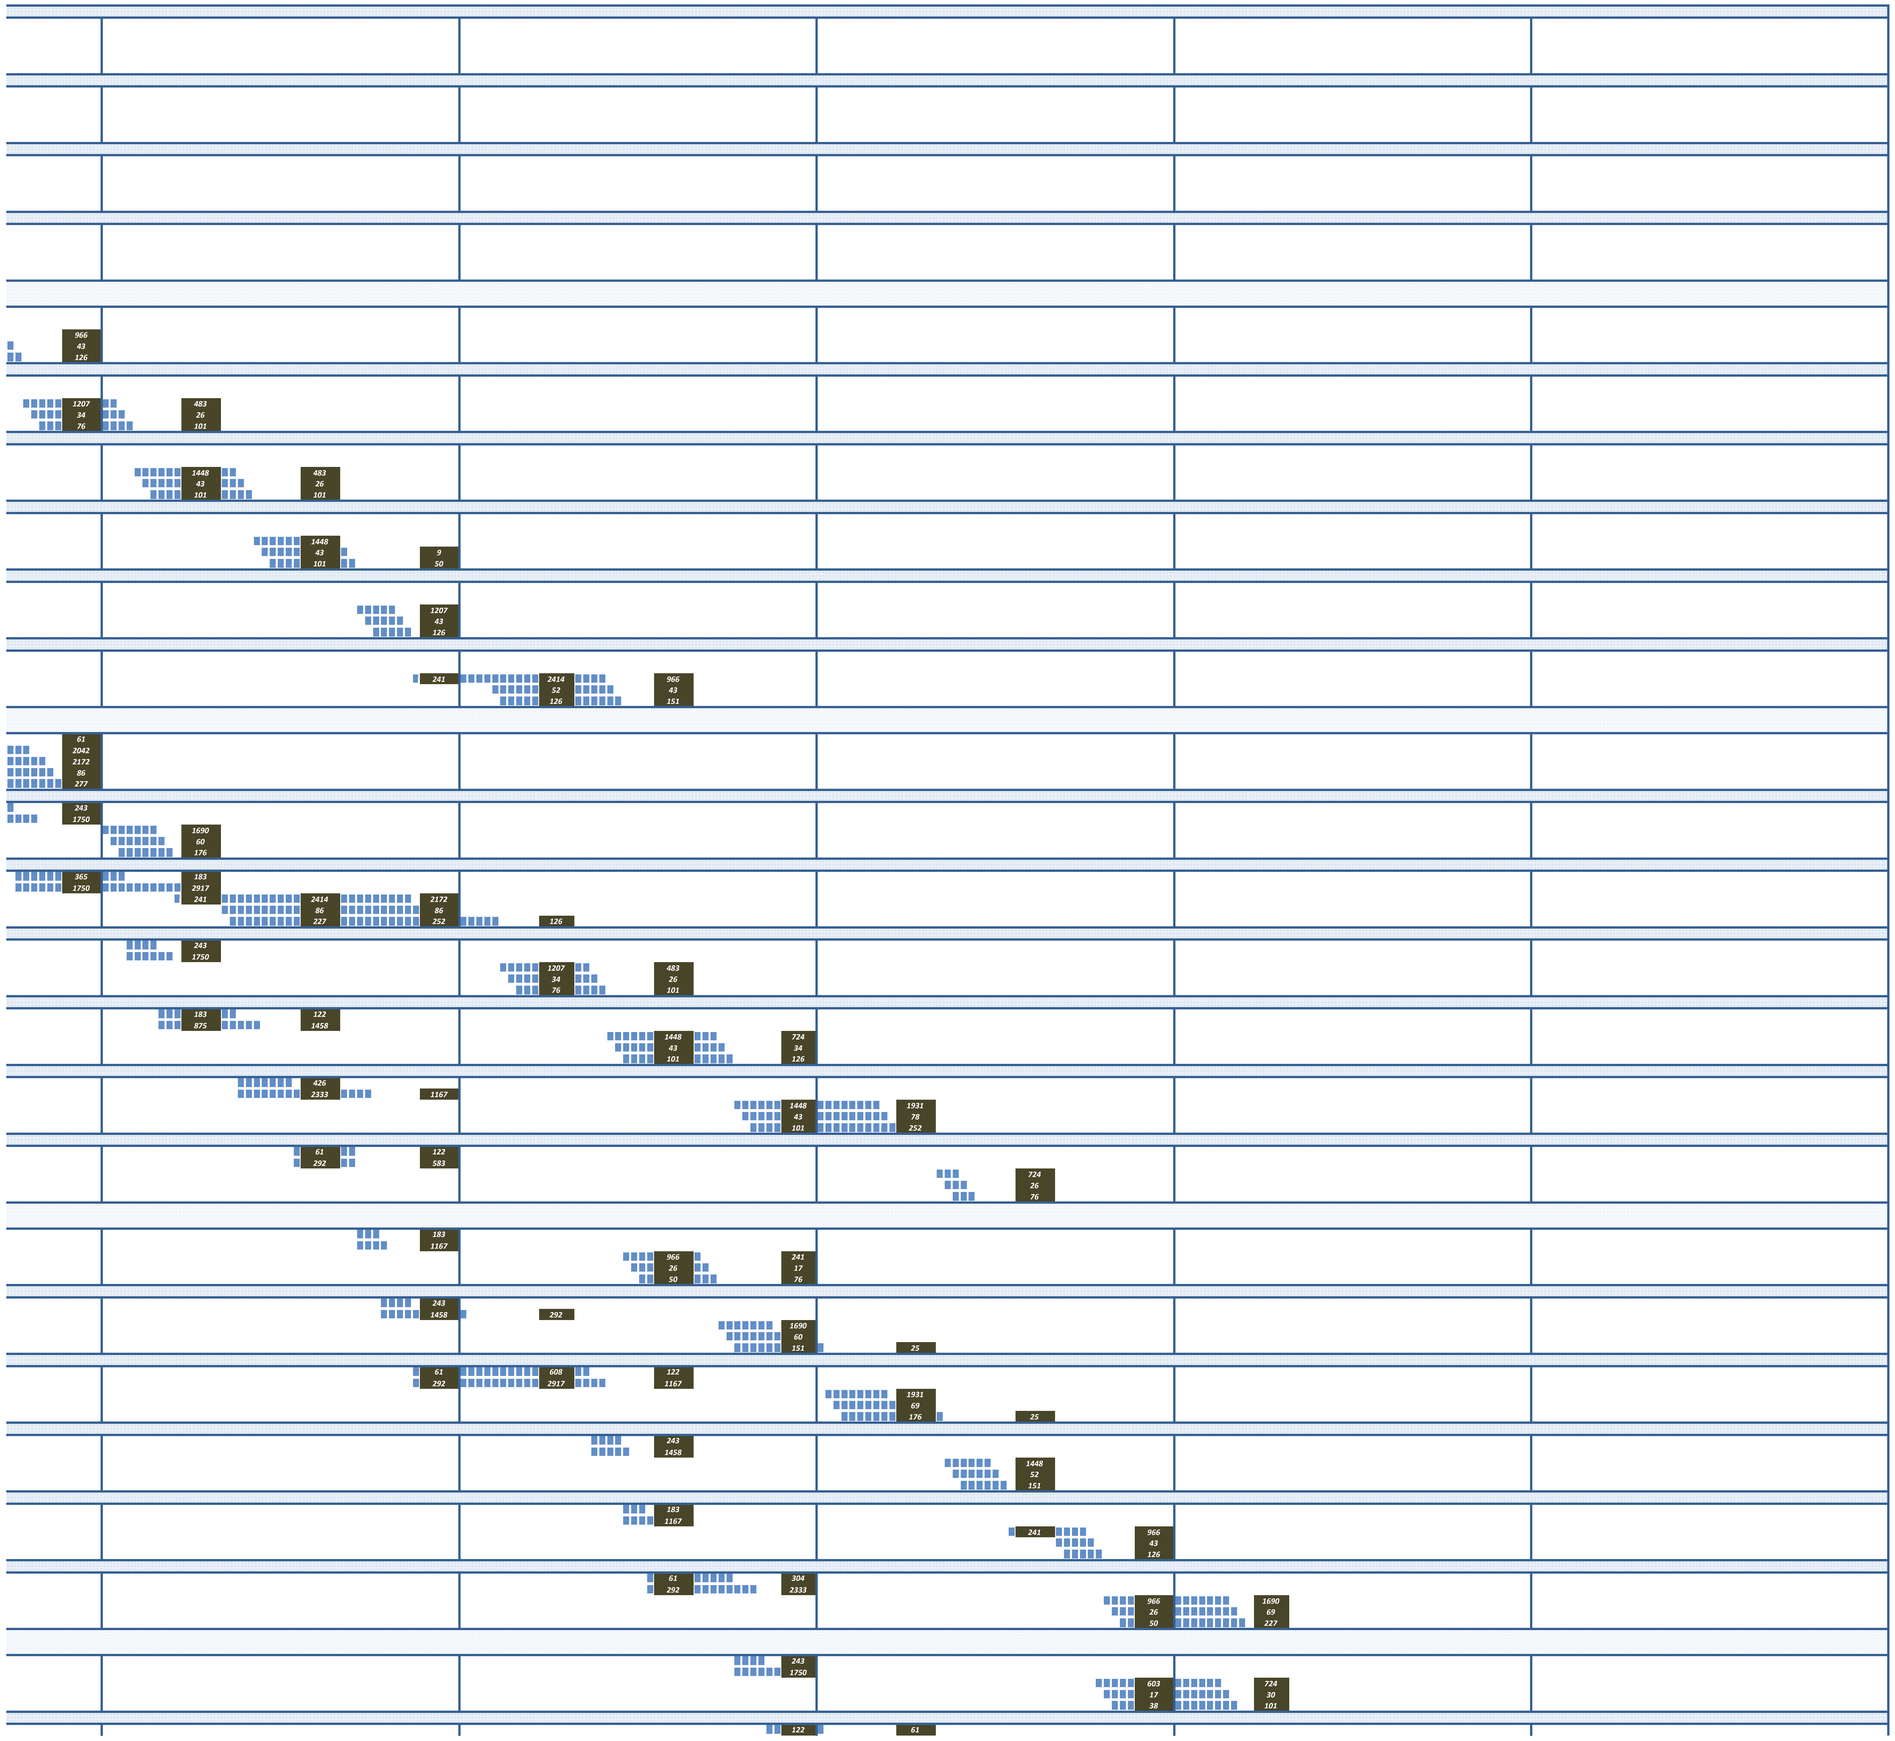
966 43 126
1207 34 76
483 26 101
1448 43 101
483 26 101
1448 43 101
9 50
1207 43 126
241
2414 52 126
966 43 151
61 2042 2172 86 277
243 1750
1690 60 176
365 1750
183 2917 241
2414 86 227
2172 86 252
126
243 1750
1207 34 76
483 26 101
183 875
122 1458
1448 43 101
724 34 126
426 2333
1167
1448 43 101
1931 78 252
61 292
122 583
724 26 76
183 1167
966 26 50
241 17 76
243 1458
292
1690 60 151
25
61 292
608 2917
122 1167
1931 69 176
25
243 1458
1448 52 151
183 1167
241
966 43 126
61 292
304 2333
966 26 50
1690 69 227
243 1750
603 17 38
724 30 101
122
61

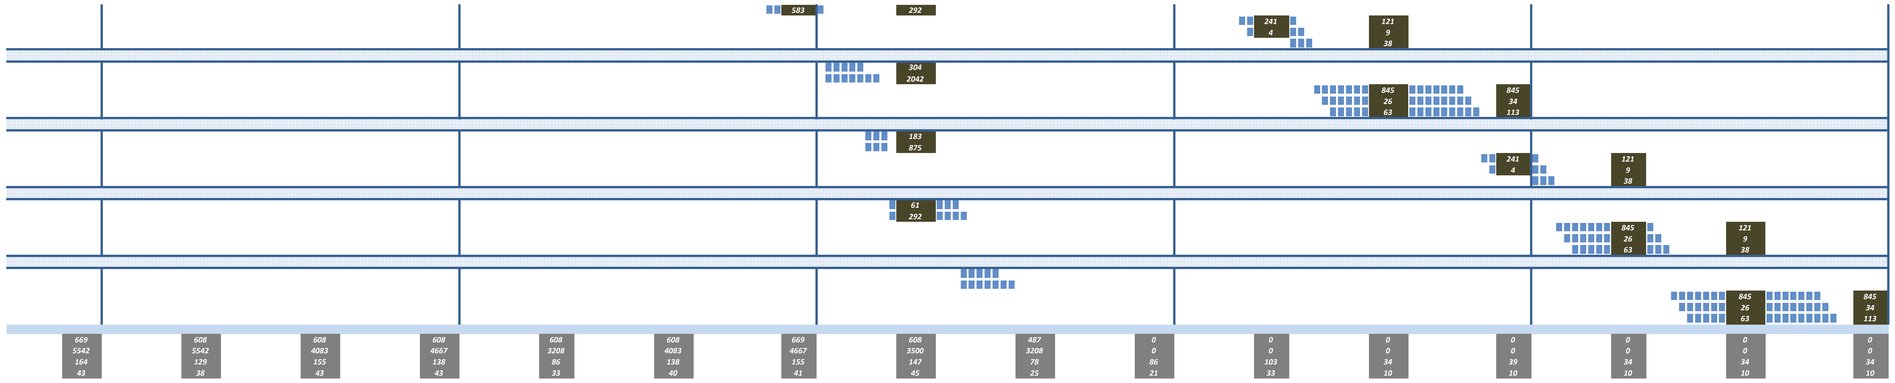

	апр.17			май.17			июн.17			июл.17			авг.17		
3-декада	1-я декада	2-я декада	3-я декада	1-я декада	2-я декада	3-декада	1-я декада	2-я декада	3-я декада	1-я декада	2-я декада	3-декада	1-я декада	2-я декада	3-декада
